



30 Jahre Erfahrung als Manager & Feuerlöscher
in internationalen Softwareprojekten
(Entwicklung, Anpassung & Einführung).

Hier habe ich bereits geholfen:



Entdecken und verstehen Sie mit mir
Schwierigkeiten vorab oder im Akutfall:

- ✓ Projektauftrag, Planung und Mittel
- ✓ Steuerung, Kontrolle & Anpassungsfähigkeit
- ✓ Struktur & Arbeitsweise (Innensicht)
- ✓ Team (Operative & Menschliche Ebene)
- ✓ Management & Umfeld
(Außensicht einschl. Dienstleister /
Lieferanten)
- ✓ Technische Sicht
(Inhalt, Technologie, Verfahren & Agilität)
- ✓ Fachliche Sicht
(Inhalt, Verfahren & Agilität)



Nutzen Sie meine Erfahrung
und meinen Blick von außen.



Profitieren Sie von meinem aktuellen
Gefahrenkatalog (Erfahrungen).



Nutzen Sie meine Erfahrung,
(fast) jeden Hut schon einmal
getragen zu haben.



Entwickeln Sie mit mir
passende Maßnahmen



Reduzieren Sie Auswirkungen,
vermeidbare Kosten, Verzögerungen
und Ärger



Lassen Sie sich von mir bei
Bedarf begleiten.

Lernen Sie mich kennen

Alexander Ockl
✉ ao@task2vendor.de
☎ +49 2102 87633-0
🌐 www.ockl.eu

Lernen Sie mein Unternehmen und
ASK-THE-EXPERTS kennen


task2vendor GmbH
✉ ao@task2vendor.de
☎ +49 2102 87633-0
🌐 www.task2vendor.de



Fitness-Check Softwarevorhaben (Gefahrenanalyse)

Vorhaben	Austausch / Neuentwicklung CRM-System
Auftrag	Überprüfung der Projektplanung
Kunde	Musterkunde
Datum	24.04.2024

Analysegebiet	Betrachtete Gefahren			Analysetiefe			Ergebnis (Anzahl Gefahren)				
	Im Katalog	Im Fokus	Nicht betrachtet	Mit Auftraggeber	Mit Team	Detailprüfung	Unbewertet	0-Vernachlässigbar	1-Beobachten	2-Handlungsbedarf	3-Akuter Handlungsbedarf
Projektauftrag, Planung & Mittel	15	15	0	15	3	5	3	5	2	4	1
Steuerung, Kontrolle & Anpassungsfähigkeit	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
Struktur & Arbeitsweise	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0
Team (Operative und Menschliche Ebene)	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0
Management, Dienstleister & Umfeld	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0
Technische Umsetzung	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0
Fachliche Umsetzung	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	93	15	78	15	3	5	3	5	2	4	1

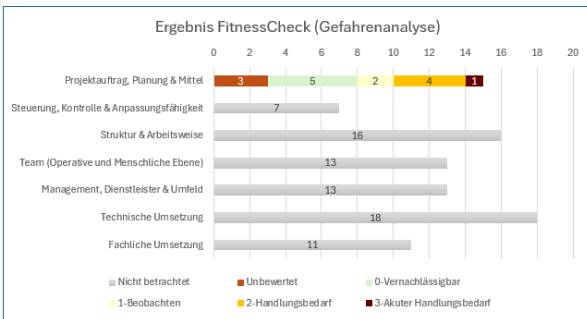

Zusammenfassung

Das Projekt hat einige Abhängigkeiten nicht berücksichtigt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Integrationsaufwand höher liegt als erwartet. Und dass die Entwicklung zu nah an den Liefertermin heran geplant ist.

Für diese Planung müssten mehr Mittel (Budget) zur Verfügung gestellt werden, damit das Vorhaben nicht gefährdet ist. Damit die Abhängigkeiten besser berücksichtigt und die Integration besser gelingen kann, empfiehlt es sich, den Projektansatz zu prüfen und ggf. anders zu gestalten.


Ausgangspunkt Gefahrenkatalog

#1 Klärung Analysziel, Analyseumfang, Analysetiefe / Beteiligung

#2 Gefahren identifizieren und verstehen

#3 Handlungsbedarf / erste Maßnahmen identifizieren

#4 Analyseabschluss (bestimmter Standort)



Optional:

- Begleitung bei der Umsetzung
- Erneute Standortbestimmung (Wiederholung)

Lernen Sie mich kennen

Alexander Ockl
 ✉ ao@task2vendor.de
 ☎ +49 2102 87633-0
 ⓘ www.ockl.eu

Lernen Sie mein Unternehmen und
ASK-THE-EXPERTS kennen

task2vendor GmbH
 ✉ ao@task2vendor.de
 ☎ +49 2102 87633-0
 ⓘ www.task2vendor.de
